



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA
EM LINHA DE MONTAGEM

Nº
232

Código dos
Produtos

6011.000.005.00.0

SAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	ESTÁGIO	ESTOQUE				
				ESGOTAR	USADO EM OUTROS PRODUTOS	CONSERVAR	FEITO "R"	OBSOLETOS
6011.005.104.00.6	COTOVELO 90 GRAUS-M10X1-3/8" UNF	1	JP02	X				

ENTRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTÁGIO	QNT	COMPONENTE	
				NORMAL DE LINHA	NOVO
6011.005.171.00.5	CJ TUBO DE FREIO	JP02	1	X	
6011.005.172.00.3	SUORTE FLEXIVEL DO FREIO	JP02	1		X
6001.005.049.00.4	PRESILHA DO FREIO	JP02	1	X	

MOTIVO/OBS: MELHORAMENTO TECNICO.

- Altera Tempos Necessita de torque Requer ferramenta ou dispositivo
 Possui alguma interferência na montagem Modifica alguma instrução de trabalho Esta conforme roteiro sim não SAP nº :

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Deve ser anotado o número do primeiro chassi a sofrer as alterações acima para cada modelo, e também o último quando a alteração for temporária.



MARRUA VTNE 3/4 - 9BYU43L59AC000152

Responsável pela implementação / Planejador Guilherme Pagatini		DATA DE EFETIVIDADE 3/08/2009	Data de Implementação: 9/11/2009
Visto Supervisor Processos	Assinatura Processo/Qualidade	Assinatura linha de montagem	Assinatura logística/materiais

Comunicar a OPMQ para que a alteração seja orientada pelo Planejador de Montagem/Auditor da Qualidade e se necessário pelo DENP

Seguem abaixo fotos referentes ao memorando

CJ TUBO DE FREIO 6011.005.171.00.5

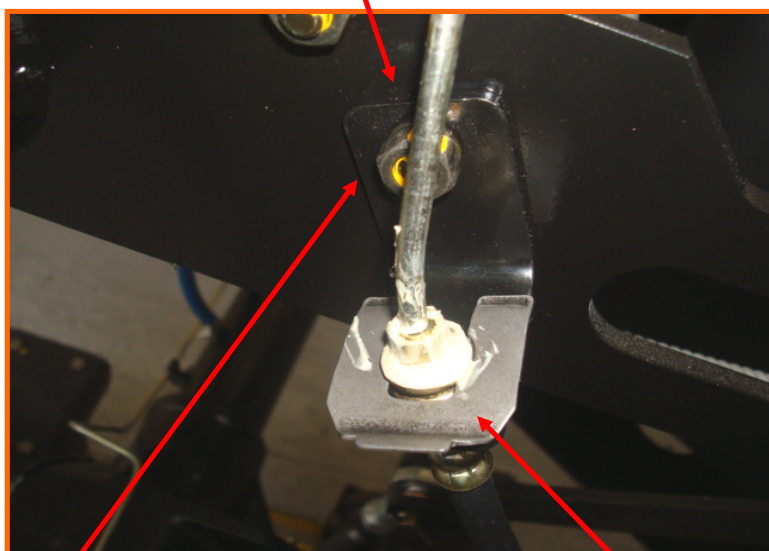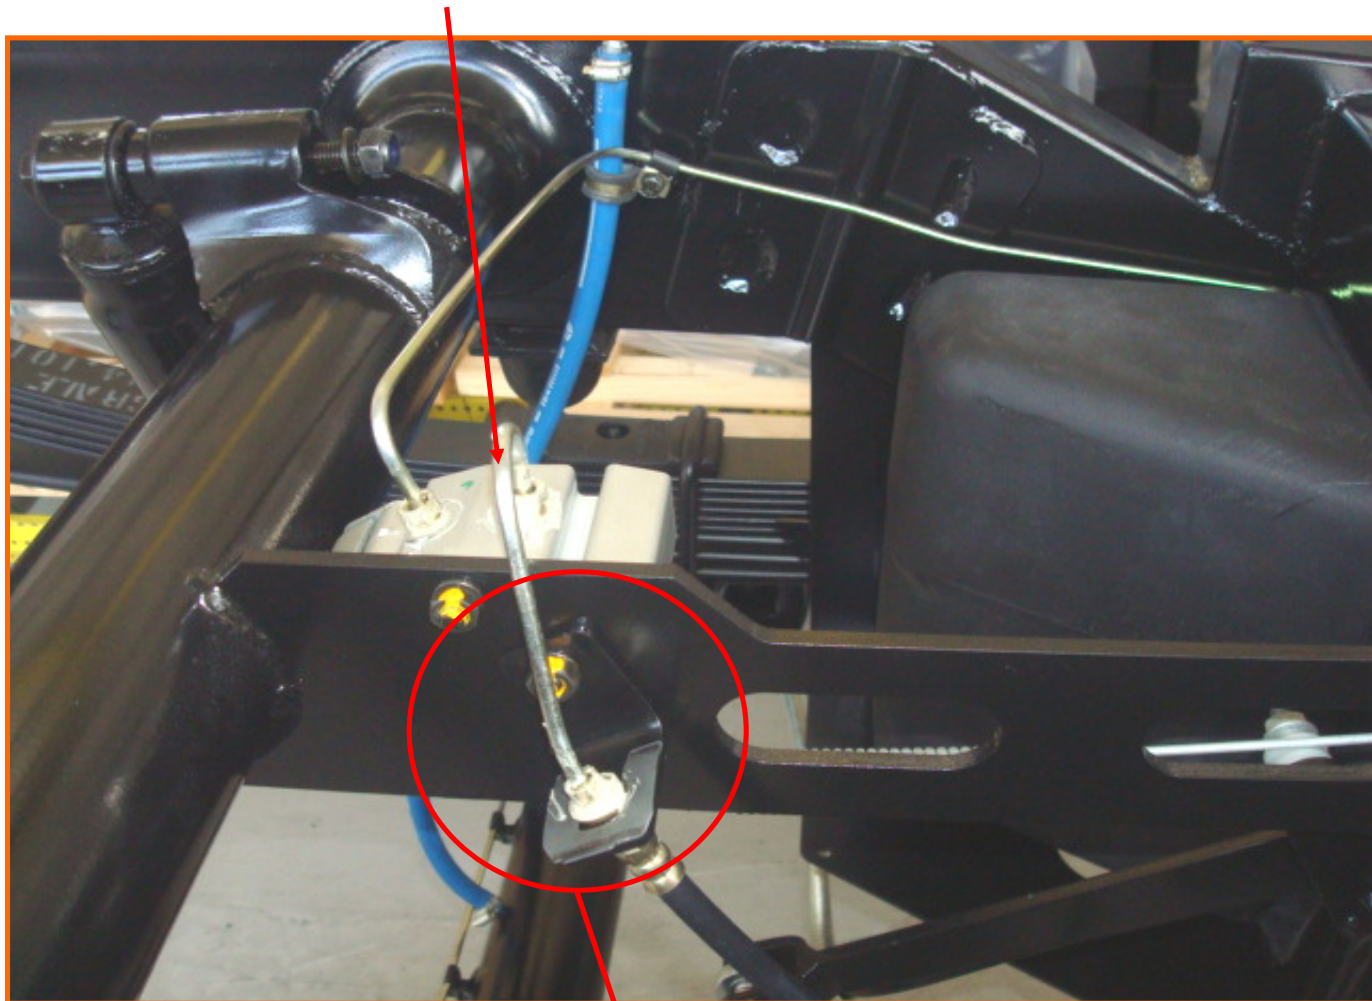

SUPORTE FLEXIVEL DO FREIO 6011.005.172.00.3

PRESILHA DO FREIO
6001.005.049.00.4
